

东莞市益卡环保科技有限公司（新建）
建设项目竣工环境保护验收监测报告

HSJC（验字）20190518001

项目名称：东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目

建设单位：东莞市益卡环保科技有限公司



东莞市华溯检测技术有限公司

二〇一九年五月

编制说明

- 1、 本报告为污染影响类建设项目竣工环境保护验收监测报告。
- 2、 本报告仅对采样分析结果负责。
- 3、 本报告涂改无效。
- 4、 本报告无复核、审核、签发签字无效。
- 5、 本报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
- 6、 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、 本报告 9.3 章节中数据引用我公司（HSJC20190518002）检测报告。

建设单位：东莞市益卡环保科技有限公司

法人代表：袁雪研

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

法人代表：何春桥

项目负责人：庄佳喜

报告编写人：李诗娟

复核：龚路

审核：黄俊能

签发：郑世琪

签发日期：2019年05月18日

建设单位：东莞市益卡环保科技有限公司

编制单位：东莞市华溯检测技术有限公司

电话：13610223572

电话：0769-27285578

传真：--

传真：0769-23116852

邮编：523000

邮编：523129

地址：东莞市虎门镇九门寨第二厂区二路3号A栋

地址：东莞市东城区牛山明新商业街六栋

目录

1 验收项目概况.....	1
2 验收依据.....	2
3 工程建设情况.....	3
3.1 地理位置及平面布置.....	3
3.2 建设内容.....	3
3.3 主要原辅材料.....	4
3.4 生产工艺.....	5
3.5 项目变动情况.....	6
4 环境保护设施.....	6
4.1 污染物治理/处置设施.....	6
4.1.1 废气.....	6
4.1.2 噪声.....	6
4.1.3 固体废物.....	6
5 审批部门审批决定.....	8
6 验收执行标准.....	8
7 验收监测内容.....	9
8 质量保证及质量控制.....	9
8.1 监测分析方法及监测仪器.....	9
8.2 人员资质.....	9
8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	9
8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	10
9 验收监测结果.....	11
9.1 监测期间天气情况.....	11
9.2 生产工况.....	11
9.3 环境保护设施调试效果.....	12
9.3.1 污染物排放监测结果.....	12
9.3.1.1 废气.....	12
9.3.1.2 厂界噪声.....	13

10 环保检查结果.....	13
10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况.....	13
10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况.....	13
11 验收监测结论.....	14
11.1 废气.....	14
11.2 噪声.....	14
11.3 固体废物.....	14
11.4 建议.....	14
12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表.....	15
附件 1 监测人员上岗证.....	16
附件 2 采样照片.....	17
附件 3 审批部门审批决定.....	18
附件 4 验收监测委托书.....	20

1 验收项目概况

东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目位于东莞市虎门镇九门寨第二厂区二路3号A栋。

项目占地面积 1300 m²，建筑面积 4000 m²。项目总投资 100 万元，其中环保投资 15 万元。该项目年产彩盒 100 吨、商标 10 吨。

《东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目环境影响报告表》由深圳市宗兴环保科技有限公司编制，并于 2018 年 8 月 15 日通过了东莞市环境保护局审批，批文号：东环建〔2018〕6200 号。

受建设单位东莞市益卡环保科技有限公司委托，我司对该项目进行竣工环境保护验收监测。2019 年 4 月 3 日，我公司组织技术人员到现场进行勘察，收集资料，对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设情况、环境保护管理、应急处置等方面进行了现场检查，依据相关规定编制了关于《东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目环境影响报告表》验收监测方案，于 2019 年 4 月 11 日~12 日开展验收监测工作，在此基础上编写本验收监测报告。


2 验收依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998 年 11 月 29 日，中华人民共和国国务院令第 682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017 年 7 月 16 日；
- (3) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号；
- (4) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告 2018 年 第 9 号；
- (5) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日第二次修正）
- (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修正）
- (7) 广东省环境保护厅，关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函，粤环函〔2017〕1945 号；
- (8) 深圳市宗兴环保科技有限公司，《东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目环境影响报告表》；
- (9) 东莞市环境保护局，《关于东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目环境影响报告表的批复》，批文号：东环建〔2018〕6200 号，2018 年 8 月 15 日；
- (10) 东莞市益卡环保科技有限公司与验收相关的其他资料。

3 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

东莞市益卡环保科技有限公司位于东莞市虎门镇九门寨第二厂区二路 3 号 A 栋 (地理坐标: N22°47'57.44", E113°39'37.94"), 厂区平面布置及监测点位图见图 3-1。

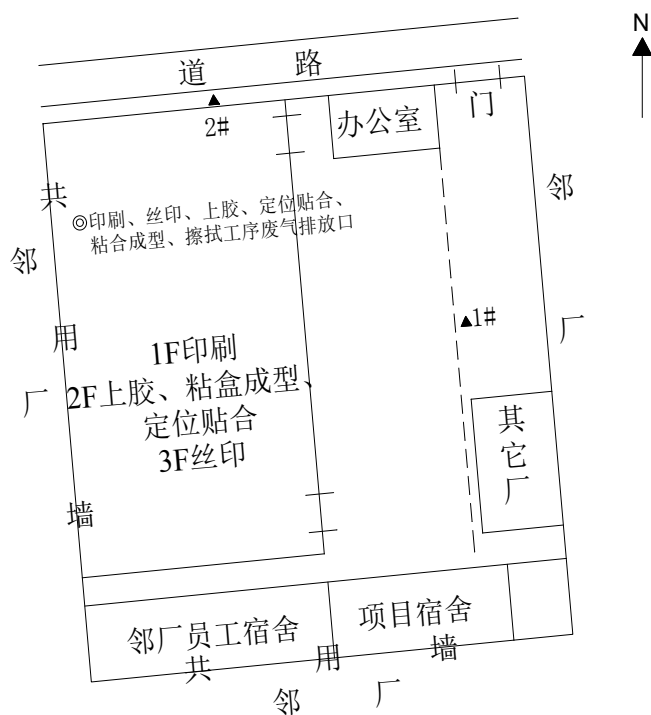

注: ◎印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘盒成型、擦拭工序废气排放口, ▲噪声监测点
图 3-1 厂区平面布置及监测点位

3.2 建设内容

东莞市益卡环保科技有限公司 (新建) 建设项目占地面积 1300 m², 建筑面积 4000 m²。项目总投资 100 万元, 其中环保投资 15 万元。该项目年产彩盒 100 吨、商标 10 吨。项目共有员工 50 人, 年工作日 300 天, 每天一班, 每班工作 8 小时。

环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比一览表见表 3-1。

表 3-1 环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对比一览表

序号	建设内容	环评数量	实际数量	是否与环评一致	备注
1	切纸机	1 台	1 台	相符	切纸
2	印刷机	2 台	2 台	相符	印刷
3	柔印机	1 台	1 台	相符	印刷
4	商标印刷机	1 台	1 台	相符	印刷
5	半自动丝印机	2 台	2 台	相符	丝印
6	自动丝印机	3 台	2 台	-1 台	丝印
7	模切机	1 台	1 台	相符	模切
8	摇臂裁断机	2 台	1 台	-1 台	模切
9	压痕切线机	3 台	3 台	相符	压痕
10	高周波机	1 台	1 台	相符	压痕
11	打鸡眼机	2 台	2 台	相符	打鸡眼
12	切商标机	1 台	1 台	相符	切商标
13	半自动天地盒成型机	2 台	2 台	相符	粘盒成型
14	自动上胶机	2 台	2 台	相符	上胶
15	自动定位机	1 台	1 台	相符	定位贴合
16	自动打角机	1 台	1 台	相符	打角
17	开槽机	1 台	1 台	相符	开槽
18	数控介样机	1 台	1 台	相符	打样
19	激光介样机	1 台	1 台	相符	打样

3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料见表3-2。

表 3-2 项目主要原辅材料一览表

序号	名称	环评设计年用量	实际年用量	备注
1	纸板	60.1 吨	60.1 吨	外购
2	纸张	40.1 吨	40.1 吨	外购
3	不干胶纸	10.1 吨	10.1 吨	外购
4	水性油墨	1 吨	1 吨	外购
5	白乳胶	1.5 吨	1.5 吨	外购
6	白电油	0.05 吨	0.05 吨	外购

3.4 生产工艺

污染物标识符号：

废气：G有机废气；

固废：S₁纸张边角料；S₂纸板边角料；S₃废抹布；S₄不干胶纸边角料；

噪声：N噪声。

①彩盒生产工艺及产污环节流程图：

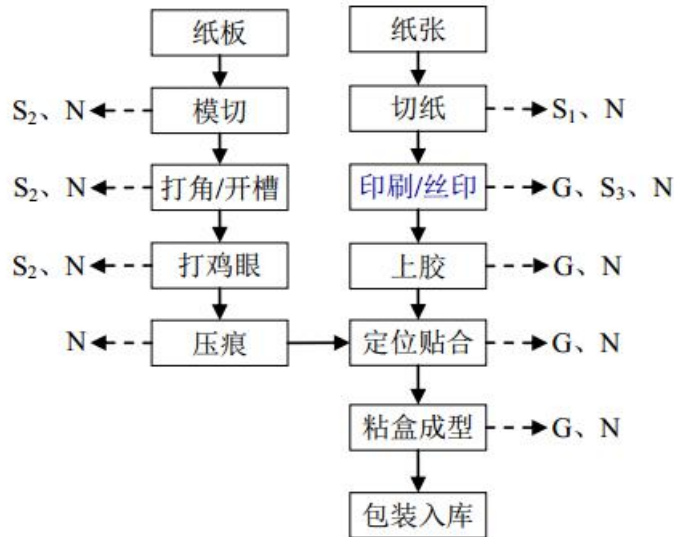


图 3-3 彩盒生产工艺及产污环节流程图

工艺说明：

项目将外购的纸张根据客户要求要求进行切纸，然后通过印刷机/半自动丝印机/全自动丝印机印上所需图案。项目将外购的纸板的根据客户要求要求进行模切，然后进行打角、开槽、打鸡眼、压痕加工。印刷后的纸张上胶后与加工后的纸板定位贴合后，通过半自动天地盒成型机粘盒成型，包装后即可入库。

②商标生产工艺及产污环节流程图：




图 3-4 商标生产工艺及产污环节流程图

工艺说明：

项目将外购的不干胶纸通过柔印机或商标印刷机印上所需图案，切商标后即可包装入库。

注：印刷机、柔印机、半自动丝印机、全自动丝印机、商标印刷机等印刷设备清洁时，使用抹布沾取少量的白电油进行擦拭清洁，拭擦后的抹布作为危险废物经收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。

3.5 项目变动情况

根据环评及批复阶段报批的生产设备与实际使用的生产设备见对比一览表（表 3-1、）可知，该项目自动丝印机环评申报 3 台，实际为 2 台；摇臂裁断机环评申报 2 台，实际为 1 台。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废气

该项目产生的废气主要是印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气。

项目在印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型以及对印刷设备进行擦拭清洁等过程中，会产生少量的有机废气，主要污染物为总 VOCs。印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气收集经 UV 光解+活性炭处理后，由 20m 排气筒高空排放。

4.1.2 噪声

项目噪声主要来源于普通加工机械、风机等设备运行时产生的噪声。

该项目通过对主要噪声产生设备安装隔振垫，加强日常维护，合理布置高噪声设备等以衰减噪声。

4.1.3 固体废物

该项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

①生活垃圾：交环卫部门处理。

②一般工业固体废物：项目生产过程中产生的纸张边角料、纸板边角料、不干胶纸边角料，交专业单位回收处理。

③危险废物：项目产生的废抹布、废活性炭、废油墨罐、废白乳胶罐、废白电油罐，交由有相关资质单位回收处理。

综上所述，各污染物及其排放情况见表 4-1。

表 4-1 污染防治措施及“三同时”落实情况一览表

内容 类型	排放源	污染物名称	环评及批复要求	防治措施	污染物排放方式 及去向	相符性
废气	印刷、丝印、上胶、 定位贴合、粘合成 型、擦拭工序	总 VOCs	设置在密闭车间内，将有机废气 经收集后，引至 UV 光解+活性 炭吸附装置处理后高空排放	设置在密闭车间，废气收集经 UV 光解+活性炭处理	通过 20 m 排气筒 高空排放	与环评及批复 要求一致
噪声	普通加工机械、 风机	噪声	采用消声、降噪、隔音措施	主要噪声产生设备安装隔振 垫，加强日常维护，合理布置 高噪声设备	/	与环评及批复 要求一致
固体废物	员工生活	生活垃圾	交环卫部门处理	交环卫部门处理	交环卫部门处理	与环评及批复 要求一致
	生产过程	纸张边角料、纸 板边角料、不干 胶纸边角料	交专业单位回收处理	交专业单位回收处理	交专业单位回收 处理	与环评及批复 要求一致
		废抹布、废活性 炭、废油墨罐、 废白乳胶罐、 废白电油罐	交由有相关资质单位回收处理	交由有相关资质单位回收处理	交由有相关资质 单位回收处理	与环评及批复 要求一致

5 审批部门审批决定

东莞市环境保护局《关于东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目环境影响报告表》的批复，批文号：东环建（2018）6200号，2018年8月15日，见附件3。

6 验收执行标准

（1）废气验收执行标准

印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）第II时段排放限值。

具体见表6-1。

表 6-1 废气排放执行标准限值

验收项目	污染物	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	排气筒高度 (m)
印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气	总 VOCs	80	5.1	20

注：执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/815-2010）第II时段排放限值。

（2）噪声验收执行标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。厂界噪声执行标准见表6-2。

表 6-2 工业企业厂界环境噪声标准

验收项目	标准名称	类别	Leq (dB (A))
			昼间
厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	3类	65

7 验收监测内容

具体监测内容见表 7-1。

表 7-1 验收项目、监测点位及监测因子、频次一览表

验收项目	监测点位	监测因子	监测频次	备注
废气	印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气处理前、排放口	总 VOCs	连续监测 2 天，每天分时段监测 3 次。	--
厂界噪声	厂界东面外 1m 处	连续等效声级 (Leq)	连续监测 2 天，每天昼间监测 1 次。	南、西面厂界为邻厂共用墙，故未监测
	厂界北面外 1m 处			

8 质量保证及质量控制

验收监测在工况、生产负荷和污染治理设施负荷均稳定时进行。

8.1 监测分析及监测仪器

根据该项目验收执行标准要求的监测分析方法执行，见表 8-1。

表 8-1 监测分析及监测仪器

监测类别	监测项目	监测方法	使用仪器	检出限或范围
废气	总 VOCs	气相色谱法 DB 44/815-2010 附录 D	气相色谱仪 GC9800	0.01 mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	多功能声级计 AWA5688	28~133dB (A)

8.2 人员资质

此次验收参与监测人员：黄诚、卢嘉阳、杨海灵、刘日升、曾繁辉、马莲花，人员上岗证见附件1。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1) 尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
- (2) 所有监测仪器均在检定/校准周期内。
- (3) 废气监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核(标定)，大气采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。在测试时保证其采样流量的准确。废气全程序空白测试及仪器校准结果见下表：

表 8-2 大气采样器校准记录一览表

监测日期	仪器型号	示值流量 (L/min)	校准流量 (L/min)	示值误差 (%)	允许示值误差范围 (%)	达标 情况
2019.04.11	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.502	0.4	±5	达标
		0.500	0.501	0.2	±5	达标
		0.500	0.502	0.4	±5	达标
2019.04.12	大气采样器 崂应 2020	0.500	0.503	0.6	±5	达标
		0.500	0.501	0.2	±5	达标
		0.500	0.501	0.2	±5	达标

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 合理布设监测点位，保证各监测点布设的科学性和可比性。

(2) 噪声监测分析过程中，使用经计量部门检定的、并在有效使用期内的声级计；声级计在测量前后用标准声源在现场进行校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB。

声级计校准记录一览表见下表：

表 8-3 声级计校准记录一览表

监测日期	仪器型号	校准设备型号	校准器标准值 dB (A)	仪器示值		示值偏差 dB	测量前后允许示值偏差范围 dB	达标情况	
2019.04.11	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	94.1	0.1	±0.5	达标
					测量后	94.0	0	±0.5	达标
2019.04.12	多功能声级计 AWA5688	声校准器 AWA6221B	94.0	昼间	测量前	93.9	-0.1	±0.5	达标
					测量后	94.1	0.1	±0.5	达标

9 验收监测结果

9.1 监测期间天气情况

监测期间天气情况见表9-1。

表9-1 监测期间天气情况一览表

时间	天气	气温℃	监测时最大风速 (m/s)	风向
2019.04.11	阴	20.4~29.2	2.7	南风
2019.04.12	阴	20.6~25.5	2.3	南风

9.2 生产工况

监测期间，企业处于正常生产状态，项目现场监测期间运行工况用产品产量核算法计算，见表9-2。

表 9-2 监测期间运行工况一览表

产品名称	设计 年产量	正常生产 日产量	2019.04.11		2019.04.12		备注
			监测期间 产量	生产 负荷	监测期间 产量	生产 负荷	
彩盒	100 吨	3.33 吨	2.83 吨	85.0%	2.63 吨	79.0%	--
商标	10 吨	0.33 吨	0.27 吨	81.8%	0.28 吨	84.8%	--

9.3 环境保护设施调试效果

9.3.1 污染物排放监测结果

9.3.1.1 废气

表 9-3 印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气监测结果

监测项目及结果											
治理措施: UV 光解+活性炭											
监测时间	监测点位	监测项目		监测结果			平均值	处理效率 (%)	标准值	达标情况	
				第一次	第二次	第三次					
2019.04.11	印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气处理前	总 VOCs	浓度 (mg/m ³)	8.51	9.32	8.84	8.89	--	--	--	
		排气筒高度 (m)		--				--	--	--	
		标况干废气量 (m ³ /h)		12240	11880	12150	12090	--	--	--	
		流速 (m/s)		13.6	13.2	13.5	13.4	--	--	--	
	印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气排放口	总 VOCs	排放浓度 (mg/m ³)	1.72	2.15	1.93	1.93	79.6	80	达标	
			排放速率 (kg/h)	2.0×10 ⁻²	2.5×10 ⁻²	2.2×10 ⁻²	2.2×10 ⁻²		5.1	达标	
		排气筒高度 (m)		20				--	--	--	
		标况干废气量 (m ³ /h)		11376	11520	11160	11352	--	--	--	
		流速 (m/s)		15.8	16.0	15.5	15.8	--	--	--	
								--	--	--	
	2019.04.12	印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气处理前	总 VOCs	浓度 (mg/m ³)	8.39	8.16	8.67	8.41	--	--	--
			排气筒高度 (m)		--				--	--	--
标况干废气量 (m ³ /h)			12330	12510	11970	12270	--	--	--		
流速 (m/s)			13.7	13.9	13.3	13.6	--	--	--		
印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气排放口		总 VOCs	排放浓度 (mg/m ³)	1.64	1.47	1.79	1.63	82.4	80	达标	
			排放速率 (kg/h)	1.8×10 ⁻²	1.7×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	1.8×10 ⁻²		5.1	达标	
		排气筒高度 (m)		20				--	--	--	
		标况干废气量 (m ³ /h)		10872	11304	11232	11136	--	--	--	
		流速 (m/s)		15.1	15.7	15.6	15.5	--	--	--	
								--	--	--	

注: 1、执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010) 第 II 时段排放限值;
2、本结果只对当时采集的样品负责。

9.3.1.2 厂界噪声

表 9-4 厂界噪声监测结果

监 测 项 目 及 结 果			单 位: dB(A)		
编号	监测点位	监测时间	监测结果 (Leq)	标准值	达标情况
			昼间	昼间	
1#	厂界外东 1m 处	2019.04.11	60.4	65	达标
		2019.04.12	60.1	65	达标
2#	厂界外北 1m 处	2019.04.11	61.4	65	达标
		2019.04.12	61.7	65	达标

注：1、项目南、西面厂界为邻厂共用墙，故未监测；
2、执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准；
3、本结果只对当时监测结果负责。

10 环保检查结果

10.1 执行国家建设项目环境管理制度情况

项目基本执行了环境影响评价制度和配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

10.2 环境保护审批手续及环境保护档案资料管理情况

《东莞市益卡环保科技有限公司（新建）建设项目环境影响报告表》由深圳市宗兴环保科技有限公司编制，并于 2018 年 8 月 15 日通过了东莞市环境保护局审批，批文号：东环建〔2018〕6200 号。

11 验收监测结论

11.1 废气

印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘合成型、擦拭工序废气中总 VOCs 达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/815-2010) 第 II 时段排放限值要求。

11.2 噪声

项目东、北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准要求。

11.3 固体废物

①生活垃圾：交环卫部门处理。

②一般工业固体废物：纸张边角料、纸板边角料、不干胶纸边角料，交专业单位回收处理。

③危险废物：废抹布、废活性炭、废油墨罐、废白乳胶罐、废白电油罐，交由有相关资质单位回收处理。

11.4 建议

(1) 加强污染源治理设施管理，完善治理设施运行台账，确保废气污染源治理长期稳定达标排放；

(2) 加强环保管理人员培训，落实环境保护管理制度，并自觉接受环保部门的监督管理和监测；

(3) 对高噪声设备保持有效的防振隔声措施，优化厂区平面布置，增加绿化面积；

(4) 加强固体废物的规范化管理，按要求完善各污染物的标志。

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 东莞市华溯检测技术有限公司


填表人(签字):


项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	东莞市益卡环保科技有限公司(新建)建设项目				项目代码	无		建设地点	东莞市虎门镇九门寨第二厂区二路3号A栋			
	行业类别(分类管理名录)	30_印刷厂;磁材料制品				建设性质	■新建 □改扩建 □变更 □后环评						
	设计生产能力	年产彩盒100吨、商标10吨				实际生产能力	年产彩盒100吨、商标10吨		环评单位	深圳市宗兴环保科技有限公司			
	环评文件审批机关	东莞市环境保护局				审批文号	东环建(2018)6200号		环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	--				竣工日期	--		排污许可证申领时间	--			
	环保设施设计单位	--				环保设施施工单位	--		本工程排污许可证编号	--			
	验收单位	东莞市华溯检测技术有限公司				环保设施监测单位	--		验收时监测工况	79.0%~85.0%			
	投资总概算(万元)	100				环保投资总概算(万元)	15		所占比例(%)	15.0			
	实际总投资(万元)	100				实际环保投资(万元)	15		所占比例(%)	15.0			
	废水治理(万元)	--	废气治理(万元)	--	噪声治理(万元)	--	固体废物治理(万元)	--	绿化及生态(万元)	--			
新增废水处理设施能力	--				新增废气处理设施能力	--		年平均工作时	2400h				
运营单位	东莞市益卡环保科技有限公司			运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)			--		验收时间	2019年4月11日~12日			
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	化学需氧量	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氨氮	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	石油类	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	废气	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	总VOCs	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	SO ₂	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	NO _x	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业固体废物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
与项目有关的其它特征污染物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米; 水污染物排放量——吨/年; 大气污染物排放量——吨/年

附件 1 监测人员上岗证

说 明	校准/检验检测能力证粤R字第 5543 号
一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。	姓 名 <u>黄 诚</u> 
二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。	性 别 <u>男</u>
三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。	出生年月 <u>1991.08</u>
四、此证不得转借、涂改无效。	文化程度 <u>本科</u> 职称 <u>/</u>
五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。	工作单位 <u>东莞市华溯检测技术有限公司</u>
	发证单位：广东计量协会

说 明	校准/检验检测能力证粤R字第 5545 号
一、依据检验检测机构资质认定评审准则要求和认证、认可的有关规定，经考核合格，颁发此证。	姓 名 <u>马莲花</u> 
二、此证是从事校准、检验检测（含抽样）相关项目工作的人员通过培训、考核合格的证明。	性 别 <u>女</u>
三、无照片、发证单位印章、钢印的证书无效。	出生年月 <u>1992.08</u>
四、此证不得转借、涂改无效。	文化程度 <u>大专</u> 职称 <u>/</u>
五、此证从发证之日起，有效期三年。到期须向原发证单位申请延期。	工作单位 <u>东莞市华溯检测技术有限公司</u>
	发证单位：广东计量协会

附件 2 采样照片



附件 3 审批部门审批决定

东莞市环境保护局

东环建(2018)6200 号

关于东莞市益卡环保科技有限公司(新建) 建设项目环境影响报告表的批复

东莞市益卡环保科技有限公司:

你单位委托深圳市宗兴环保科技有限公司编制的《东莞市益卡环保科技有限公司(新建)建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究,批复如下:

一、东莞市益卡环保科技有限公司在东莞市虎门镇九门寨第二厂区二路3号A栋(与营业执照地址相符,厂址中心坐标:北纬 22°47'57.44", 东经 113°39'37.94")建设,项目占地面积 1300m²、建筑面积 4000m²,建设后年加工彩盒 100 吨、商标 10 吨。建设后设有印刷机 2 台、商标印刷机 1 台、自动丝印机 3 台等生产设备(设备数量、种类详见该建设项目环境影响报告表内容),禁止其它非许可生产工序、设备、原料的投入使用等违法行为,若需新增必须依法申报。

根据报告表的评价结论,在全面落实报告表提出的各项污染防治措施,并确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下,项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施进行建设,从环境保护角度可行。

二、环境保护要求:

(一)不允许排放生产性废水。生活污水经隔油隔渣池及三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政截污管网,引至东莞市虎门海岛污水处理厂处理。

(二)印刷、丝印、上胶、定位贴合、粘盒成型、擦拭工序须设置在密闭车间内,产生的废气经配套处理设施收集处理后高

空排放，废气排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 第II时段排气筒VOCs排放限值；厨房炉灶以电能为能源，油烟经油烟净化器处理后引至高空排放，油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 的标准要求。

(三) 做好设备的消声降噪措施，边界噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目生产过程产生的一般工业固体废物委托有相应资质的单位处理处置，危险废物交有资质的单位回收处理，生活垃圾由环卫部门回收处理。

三、按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口，安装主要污染物在线监控系统，按环保部门的要求实施联网监控。

四、项目建设须认真落实配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

六、该项目须符合法律、行政法规，涉及其它须许可的事项，取得许可后方可建设。



附件 4 验收监测委托书

验收监测委托书

东莞市华溯检测技术有限公司：

现我东莞市益卡环保科技有限公司委托贵公司承担我公司环境保护验收监测工作，并编制环境保护验收监测报告。

望贵公司受委托后，按照国家和广东省有关法律、法规、标准和文件开展本项目的验收监测工作。

特此委托！

委托单位(盖章)：_____

日期：2019年 6 月 21 日

